


Nytt fra Helseplattformen uke 4 - 2021

Helseplattformen innfører ny pasientjournal for sykehus, kommuner, fastleger og private spesialister i Midt-Norge. Dette nyhetsbrevet lages for fagekspertene og andre med en rolle i prosjektet.

Justert innføringsplan vedtatt i styret

Etter at forsinkelse ble konstatert ba styret om en alternativ innføringsplan, utarbeidet sammen med organisasjonene som skal ta i bruk løsningen og med Epic. Den reviderte planen har månedsskiftet april-mai som tidspunkt for første produksjonssetting eller «Go-live», og ble [enstemmig godkjent av styret](#). Styret kunne også konstatere at forsinkelsene har sluttet å øke og synes det er satt inn gode tiltak for å bedre fremdrift. Saksunderlaget finner du i [styreportalen](#).

Her er en forenklet oversikt over planen som ble godkjent 25.januar.

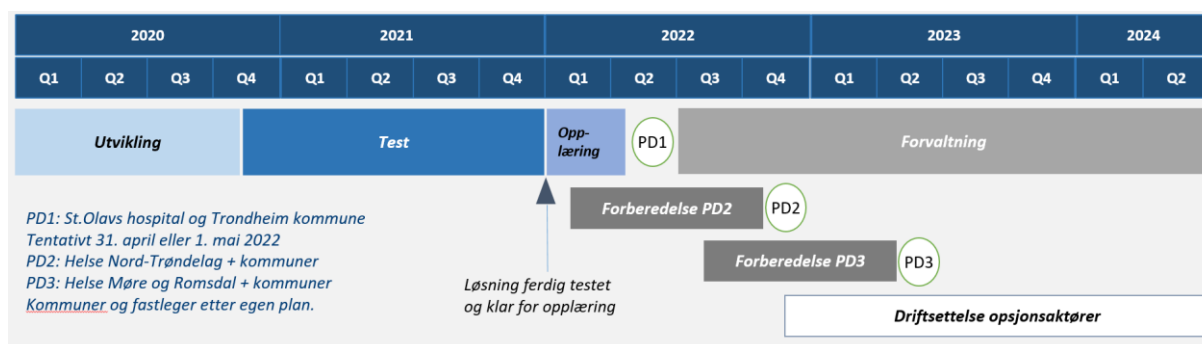

Status for bygging

Arbeidet med å sette opp Epics løsning tilpasset norske arbeidsprosesser er nærmest slutført. I november leverte Epic en oppdatert versjon av løsningen Helseplattformen skal ta i bruk, hvor også store deler er oversatt til norsk. Denne leveransen omfattet også utvikling av særnorsk funksjonalitet, spesielt knyttet til kommunene, som omtalt i forrige nyhetsbrev og [her](#).

Status for test

Test av hver enkel arbeidsflyt (Application workflow test) er gjennomført for 75% av totalt 545 arbeidsflyter. Resterende arbeidsflyter blir testet etter ferdig adopsjon og/eller bygging fram til over sommeren. Dette gir et godt utgangspunkt for neste store test, som involverer funksjonalitet på tvers av flere adopterte arbeidsflyter, applikasjoner og integrasjoner (Ende til Ende-test). Pasient-scenarier er grunnlaget for denne testen, som starter sammen med fagekspertene i uke 10. Ferdigstilling av scenariene startet i november og foregår fortsatt. Flere fagekspertene er involvert i arbeidet.

Fremdrift i arbeidet med opsjonskommuner og fastleger

Arbeidet er høyt prioritert i denne fasen, og det arbeides aktivt med involvering og tilrettelegging for opsjonsavrop, og deretter innføring, for samtlige aktører (kommuner, fastleger, avtalespesialister, avtalefysioterapeuter og andre private aktører). Arbeidet med opsjonsaktørene er krevende og komplisert, og arbeidet er styrket med ytterligere ressurser.

Har du sett filmen?

En video som enkelt forklarer arbeidet med Helseplattformen ble ferdigstilt ved nyttår. Den kan for eksempel brukes som introduksjon i møter og er tilpasset et bredt publikum. Del den gjerne i sosiale medier hvis du vil vise hva vi jobber med! Du finner den [her](#).

Deltar på film om Helseplattformen:



Jens Solem
Brukerrepresentant
Brukerpanelet



Kathinka Meirik
Faglig leder
Helse Nord-Trøndelag



Maria Charlotte Berge
Fagekspert
Trondheim kommune



Christer Mjaaset
Viseadm.dir.
Helseplattformen

Video av løsningen

Nå kan alle fagekspertene vise video av løsningen også til kolleger som ikke har tilgang til prosjektweb. Disse videoene skal ikke distribueres utenfor egen organisasjon. Det er viktig å understreke at vi viser noe som ikke er 100% ferdig, og at det kommer nye demoer i en senere fase. Vi anbefaler Google chrome eller Edge som nettleser. Lenke: <https://vimeo.com/showcase/8012686>

Passord: Demo2021

Vi ber om at du ikke sender lenker fra prosjektweb til kolleger og andre som ikke har en rolle i prosjektet. Det skaper frustrasjoner for de som ikke har tilgang til vårt arbeidsområde. Be gjerne om hjelp til å distribuere informasjon.

M365 og prosjektweb (Sharepoint)

Hemitt har endret strategi for utrulling av Microsoft 365 i hele regionen, noe som også påvirker Helseplattformen. I stedet for at hele M365 installeres på en gang, velges nå en løsning som ruller ut litt funksjonalitet av gangen.

Første steg vil være installasjon av Teams til chat og møter. Denne vil fungere ved siden av Skype, og alle har derfor mulighet til å velge applikasjon både til chat og møteinnkallinger i Outlook. Steg to for Helseplattformen vil være å ta i bruk Teams for samhandling internt. Vi kommer tilbake med mer informasjon når tidsplanen er endelig bestemt.

Smitteverntiltak oppdateres fortløpende

Restriksjoner og anbefalinger er i stadig endring, og vi prøver å oppdatere fortløpende på [prosjektweb](#). Hjemmekontor er fortsatt hovedregelen.

Nye kolleger

Nye ansatte og fagekspertene kommer stadig om bord, og det er ikke så lett å bli kjent fordi vi sitter spredt og på skype. Har du fått en ny i gruppa eller teamet, vær ekstra oppmerksom på at vedkommende finner seg til rette og får svar på sine spørsmål.

Se prosjektsamling

Prosjektsamlingene strømmes fortsatt, men nå via Vimeo. Lenke vil ligge i møteinnkallingen. Neste felles prosjektsamling er 4. februar.

Følg med på din lokale intranettside / virksomhetsportal (HF) / google disc (kommune) for flere oppdateringer fra de lokale innføringsprosjektene.
